AméricoR.Rolo construções
Obras Públicas e Construção Civil
Alvará de Construção N.º 17553
E-mail: americorolo@sapo.pt
Tlm. 96 605 14 48
Tel./Fax: 274 671 406
Rua Vila Melhorada, N.º 28
6150-554 PROENÇA-A-NOVA

PLANO DE MÃO DE OBRA

VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL E ARRANJO PAISAGÍSTICO DOS LARGOS DO CRUZEIRO E DO CALVÁRIO EM ALPALHÃO - LARGO DO CRUZEIRO

PRAZO DE EXECUÇÃO DE 240 DIAS

Câmara Municipal de NISA
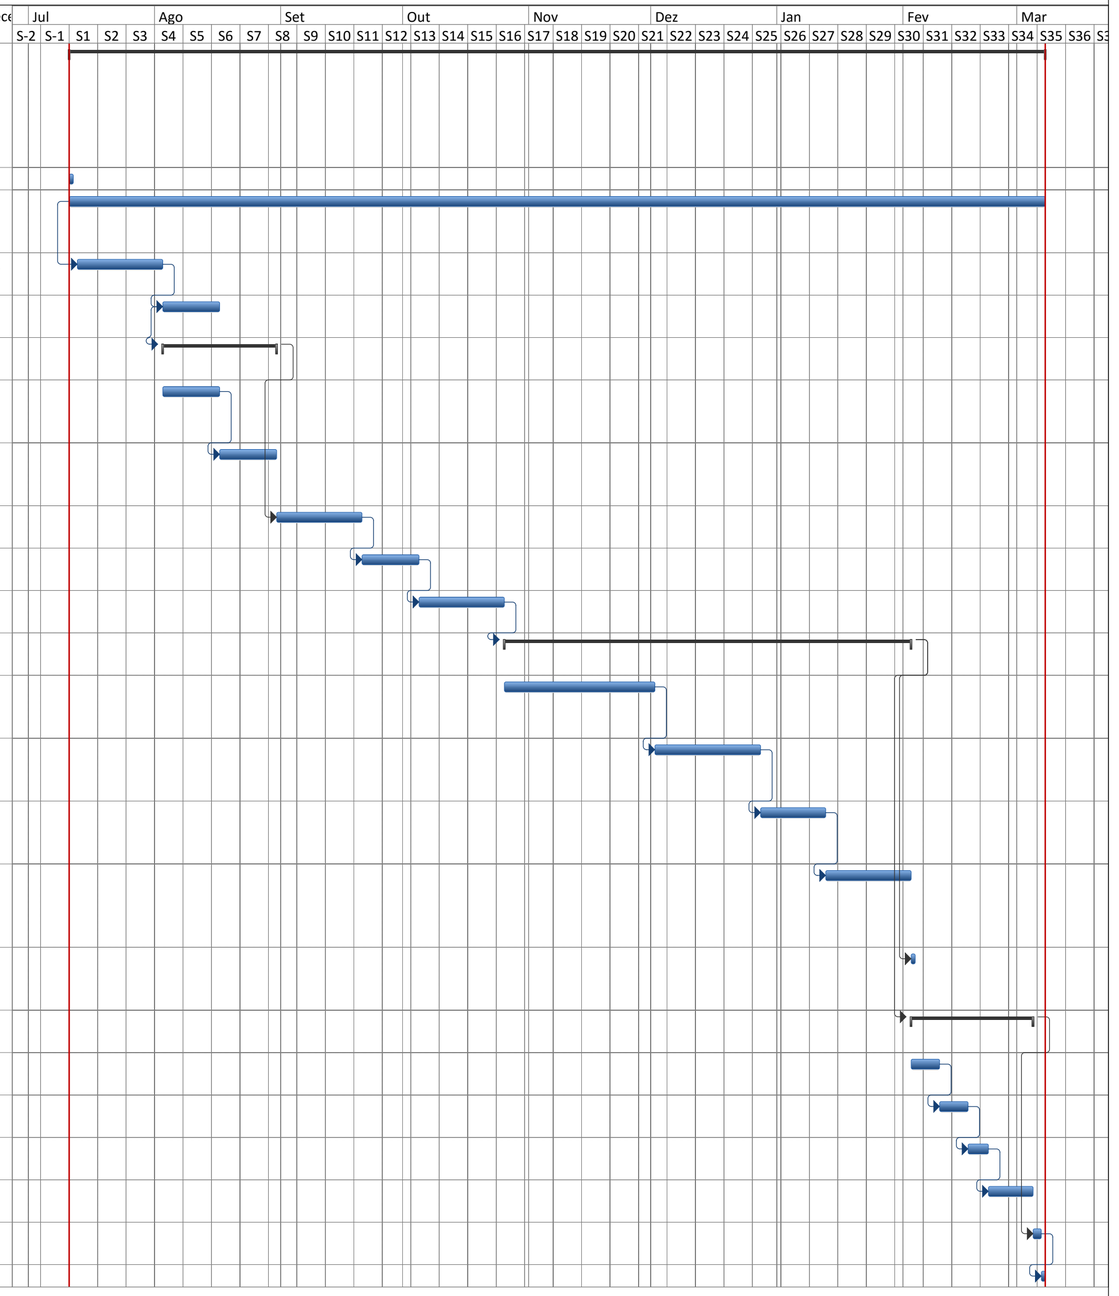
Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Mão de obra	Predece
1	VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL E ARRANJO PAISAGÍSTICO DOS LARGOS DO CRUZEIRO E DO CALVÁRIO EM ALPALHÃO - LARGO DO CRUZEIRO	240 dias	Seg 11/07/16	Ter 07/03/17		
2	CONSIGNAÇÃO	1 dia	Seg 11/07/16	Seg 11/07/16		
3	ESTALEIRO	240 dias	Seg 11/07/16	Ter 07/03/17	Tecnico Superior de HSST[1];Servente[1];Motorista de pesados[1];Manobrador de máquinas[1];Encarregado geral[1];Director de obra/Engº. Civil[1]	
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	21 dias	Qua 13/07/16	Ter 02/08/16	Manobrador de máquinas[3];Motorista de pesados[1];Servente[2]	3II+2 dias
5	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	14 dias	Qua 03/08/16	Ter 16/08/16	Canalizador[2];Manobrador de máquinas[2];Motorista de pesados[1];Pedreiro[2];Servente[2]	4
6	REDE ELÉCTRICA	28 dias	Qua 03/08/16	Ter 30/08/16		5II
7	ILUMINAÇÃO PUBLICA	14 dias	Qua 03/08/16	Ter 16/08/16	Manobrador de máquinas[2];Motorista de pesados[1];Pedreiro[1];Servente[2];Electricista[4]	
8	ILUMINAÇÃO DECORATIVA	14 dias	Qua 17/08/16	Ter 30/08/16	Electricista[4];Servente[2];Pedreiro[1];Motorista de pesados[1];Manobrador de máquinas[2]	7
9	ALVENARIAS	21 dias	Qua 31/08/16	Ter 20/09/16	Manobrador de máquinas[1];Pedreiro[3];Servente[2];Pintor[2]	6
10	SERRALHARIAS	14 dias	Qua 21/09/16	Ter 04/10/16	Serralheiro[4]	9
11	LANCIS	21 dias	Qua 05/10/16	Ter 25/10/16	Servente[2];Pedreiro[3];Manobrador de máquinas[2]	10
12	PAVIMENTAÇÕES	100 dias	Qua 26/10/16	Qui 02/02/17		11
13	CALÇADA DE PAVÉ	37 dias	Qua 26/10/16	Qui 01/12/16	Calceteiro[5];Manobrador de máquinas[2];Motorista de pesados[1];Servente[2]	
14	CALÇADA DE GRANITO 11X11	26 dias	Sex 02/12/16	Ter 27/12/16	Servente[2];Motorista de pesados[1];Manobrador de máquinas[2];Calceteiro[5]	13
15	CALÇADA DE GRANITO 6X6	16 dias	Qua 28/12/16	Qui 12/01/17	Servente[2];Motorista de pesados[1];Manobrador de máquinas[2];Calceteiro[5]	14
16	PAVIMENTO AMORTECEDOR	21 dias	Sex 13/01/17	Qui 02/02/17	Servente[2];Motorista de pesados[1];Manobrador de máquinas[2];Pedreiro[4];Aplicador de pavimento amortecedor[4]	15
17	SINALIZAÇÃO	1 dia	Sex 03/02/17	Sex 03/02/17	Servente[1];Manobrador de máquinas[1];Pedreiro[1];Aplicador de marcação rodoviaria[4]	12
18	EQUIPAMENTO URBANO	30 dias	Sex 03/02/17	Sáb 04/03/17		12
19	PARQUE INFANTIL	7 dias	Sex 03/02/17	Qui 09/02/17	Tecnico espec. em parque infantis, mobiliario urbano e equip. de fitness exterior[6]	
20	MOBILIARIO URBANO	7 dias	Sex 10/02/17	Qui 16/02/17	Tecnico espec. em parque infantis, mobiliario urbano e equip. de fitness exterior[6]	19
21	EQUIPAMENTO DE FITNESS	5 dias	Sex 17/02/17	Ter 21/02/17	Tecnico espec. em parque infantis, mobiliario urbano e equip. de fitness exterior[6]	20
22	VELAS DE ENSOMBRAMENTO	11 dias	Qua 22/02/17	Sáb 04/03/17	Tecnico espec. em parque infantis, mobiliario urbano e equip. de fitness exterior[6]	21
23	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2 dias	Dom 05/03/17	Seg 06/03/17	Servente[3]	18
24	RECEPÇÃO PROVISÓRIA	1 dia	Ter 07/03/17	Ter 07/03/17		23
