AméricoR.Rolo construções
Obras Públicas e Construção Civil
Alvará de Construção N.º 17553
E-mail: americorolo@sapo.pt
Tlm. 96 605 14 48
Tel./Fax: 274 671 406
Rua Vila Melhorada, N.º 28
6150-554 PROENÇA-A-NOVA

PLANO DE EQUIPAMENTOS

VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL E ARRANJO PAISAGÍSTICO DOS LARGOS DO CRUZEIRO E DO CALVÁRIO EM ALPALHÃO - LARGO DO CRUZEIRO

PRAZO DE EXECUÇÃO DE 240 DIAS

Câmara Municipal de NISA
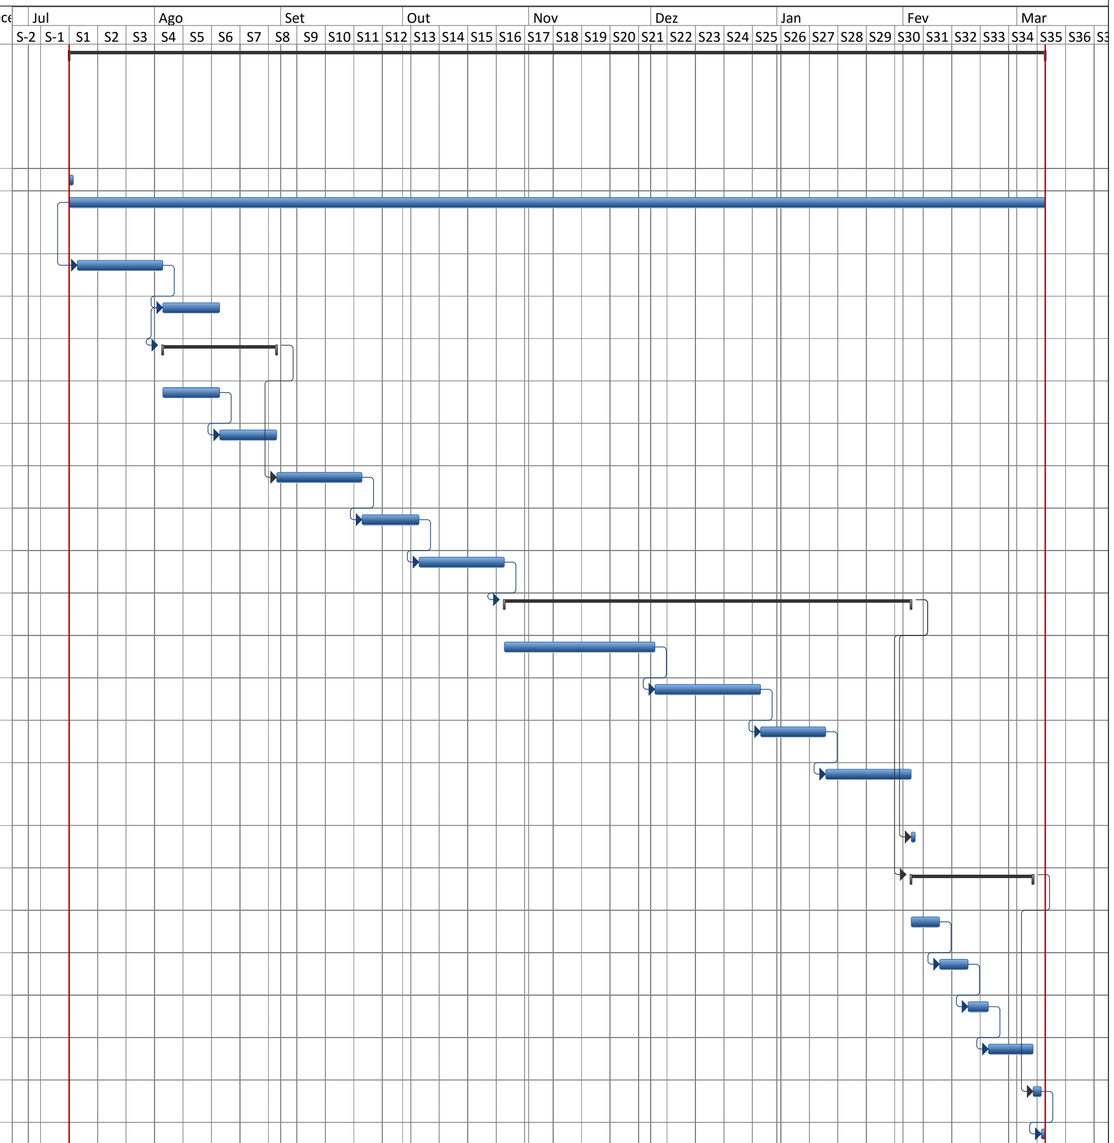
Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Equipamento	Predece
1	VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL E ARRANJO PAISAGÍSTICO DOS LARGOS DO CRUZEIRO E DO CALVÁRIO EM ALPALHÃO - LARGO DO CRUZEIRO	240 dias	Seg 11/07/16	Ter 07/03/17		
2	CONSIGNAÇÃO	1 dia	Seg 11/07/16	Seg 11/07/16		
3	ESTALEIRO	240 dias	Seg 11/07/16	Ter 07/03/17	Camião basculante[1];Contentor de ferramentaria[1];Contentor escritório[1];Equip. de protecção individual e colectiva[1];Equip. de sinalização de trabalhos e desvios de transito[1];Retroescavadora[1];Vedação[1];Contentor RCD[1];Equip.de topografia[1]	
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	21 dias	Qua 13/07/16	Ter 02/08/16	Camião basculante[2];Giratória Ex200[1];Giratória EX215[1];cilindro compactador[1];Retroescavadora[1]	3II+2 dias
5	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	14 dias	Qua 03/08/16	Ter 16/08/16	Equip.de canalizador[1];Equip.de pedreiro[1];Giratória ZX80[1];Manitou multifunções[1];Saltitão compactador[1];Camião basculante[1];Betoneira[1]	4
6	REDE ELÉCTRICA	28 dias	Qua 03/08/16	Ter 30/08/16		5II
7	ILUMINAÇÃO PUBLICA	14 dias	Qua 03/08/16	Ter 16/08/16	Betoneira[1];Camião basculante[1];Equip.de pedreiro[1];Giratória ZX80[1];Retroescavadora[1];Equipamento de electricista[1]	
8	ILUMINAÇÃO DECORATIVA	14 dias	Qua 17/08/16	Ter 30/08/16	Betoneira[1];Camião basculante[1];Equip.de pedreiro[1];Giratória ZX80[1];Retroescavadora[1];Equipamento de electricista[1]	7
9	ALVENARIAS	21 dias	Qua 31/08/16	Ter 20/09/16	Giratória ZX50[1];Equip.de pedreiro[1];Betoneira[1];Ferramentas de uso geral[1];Equipament	6
10	SERRALHARIAS	14 dias	Qua 21/09/16	Ter 04/10/16	de pintura[1] Equipamento de serralharia[1];Ferramentas de uso geral[1]	9
11	LANCIS	21 dias	Qua 05/10/16	Ter 25/10/16	placa compactadora[1];Manitou multifunções[1];Giratória ZX50[1];Ferramentas de uso geral[1];Equip.de pedreiro[1];Autobetoneira[1]	10
12	PAVIMENTAÇÕES	100 dias	Qua 26/10/16	Qui 02/02/17		11
13	CALÇADA DE PAVÉ	37 dias	Qua 26/10/16	Qui 01/12/16	Camião basculante[1];Manitou multifunções[1];Giratória ZX80[1];Ferramentas de uso geral[1];cilindro compactador[1];Equip.calceteiro[1];placa compactadora[1]	
14	CALÇADA DE GRANITO 11X11	26 dias	Sex 02/12/16	Ter 27/12/16	Camião basculante[1];Equip.calceteiro[1];Ferramentas de uso geral[1];Giratória ZX80[1];cilindro compactador[1];Manitou multifunções[1];placa compactadora[1]	13
15	CALÇADA DE GRANITO 6X6	16 dias	Qua 28/12/16	Qui 12/01/17	Camião basculante[1];Equip.calceteiro[1];Ferramentas de uso geral[1];Giratória ZX80[1];cilindro compactador[1];Manitou multifunções[1];placa compactadora[1]	14
16	PAVIMENTO AMORTECEDOR	21 dias	Sex 13/01/17	Qui 02/02/17	Camião basculante[1];Manitou multifunções[1];Giratória ZX80[1];Ferramentas de uso geral[1];cilindro compactador[1];Equip. de aplic. de pav. amortecedor[1];Autobetoneira[1];Equip.de pedreiro[1]	15
17	SINALIZAÇÃO	1 dia	Sex 03/02/17	Sex 03/02/17	Equip.de pedreiro[1];Betoneira[1];Retroescavadora[1];Equipamento de marcação rodoviaria [1]	12
18	EQUIPAMENTO URBANO	30 dias	Sex 03/02/17	Sáb 04/03/17		12
19	PARQUE INFANTIL	7 dias	Sex 03/02/17	Qui 09/02/17	Equipamento especifico[1]	
20	MOBILIARIO URBANO	7 dias	Sex 10/02/17	Qui 16/02/17	Equipamento especifico[1]	19
21	EQUIPAMENTO DE FITNESS	5 dias	Sex 17/02/17	Ter 21/02/17	Equipamento especifico[1]	20
22	VELAS DE ENSOMBRAMENTO	11 dias	Qua 22/02/17	Sáb 04/03/17	Equipamento especifico[1]	21
23	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2 dias	Dom 05/03/17	Seg 06/03/17	Equipamento de limpeza[1]	18
24	RECEPÇÃO PROVISÓRIA	1 dia	Ter 07/03/17	Ter 07/03/17		23
