AméricoR.Rolo construções
Obras Públicas e Construção Civil
Alvará de Construção N.º 17553
E-mail: americorolo@sapo.pt
Tlm. 96 605 14 48
Tel./Fax: 274 671 406
Rua Vila Melhorada, N.º 28
6150-554 PROENÇA-A-NOVA

PLANO DE TRABALHOS

VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL E ARRANJO PAISAGÍSTICO DOS LARGOS DO CRUZEIRO E DO CALVÁRIO EM ALPALHÃO - LARGO DO CRUZEIRO

PRAZO DE EXECUÇÃO DE 240 DIAS

Câmara Municipal de NISA
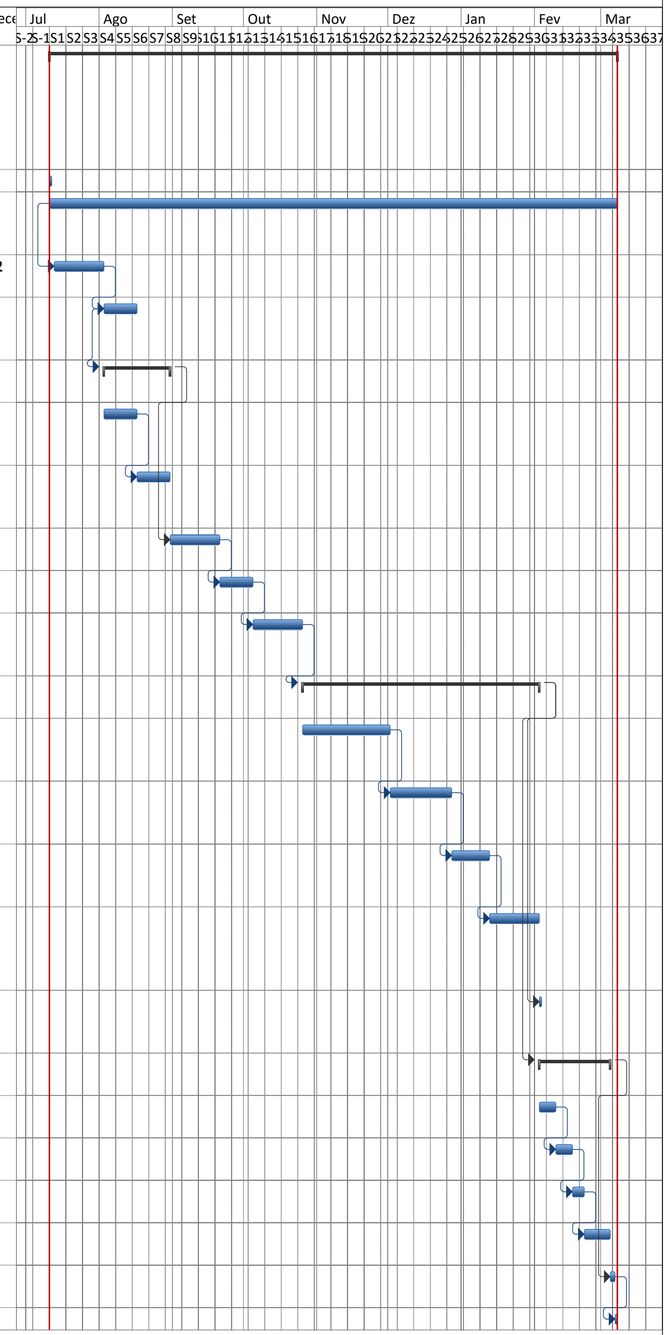
Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Equipamento	Mão de obra	Predece
1	**VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL E ARRANJO PAISAGÍSTICO DOS LARGOS DO CRUZEIRO E DO CALVÁRIO EM ALPALHÃO - LARGO DO CRUZEIRO**	**240 dias**	**Seg 11/07/16**	**Ter 07/03/17**			
2	**CONSIGNAÇÃO**	**1 dia**	**Seg 11/07/16**	**Seg 11/07/16**			
3	**ESTALEIRO**	**240 dias**	**Seg 11/07/16**	**Ter 07/03/17**	**Camião basculante[1];Contentor de ferramentaria[1];Contentor escritório[1];Equip. de protecção individual e colectiva[1];Equip. de sinalização de trabalhos e desvios de**	**Tecnico Superior de HSST[1];Servente[1];Motorista de pesados[1];Manobrador de máquinas[1];Encarregado geral[1];Director de obra/Engº. Civil[1]**	
4	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS**	**21 dias**	**Qua 13/07/16**	**Ter 02/08/16**	**Camião basculante[2];Giratória Ex200[1];Giratória EX215[1];cilindro compactador[1];Retroescavadora[1]**	**Manobrador de máquinas[3];Motorista de pesados[1];Servente[2]**	**3II+2 dias**
5	**REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**	**14 dias**	**Qua 03/08/16**	**Ter 16/08/16**	**Equip.de canalizador[1];Equip.de pedreiro[1];Giratória ZX80[1];Manitou multifunções[1];Saltitão compactador[1];Camião basculante[1];Betoneira[1]**	**Canalizador[2];Manobrador de máquinas[2];Motorista de pesados[1];Pedreiro[2];Servente[2]**	**4**
6	**REDE ELÉCTRICA**	**28 dias**	**Qua 03/08/16**	**Ter 30/08/16**			**5II**
7	**ILUMINAÇÃO PUBLICA**	**14 dias**	**Qua 03/08/16**	**Ter 16/08/16**	**Betoneira[1];Camião basculante[1];Equip.de pedreiro[1];Giratória ZX80[1];Retroescavadora[1];Equipamento de electricista[1]**	**Manobrador de máquinas[2];Motorista de pesados[1];Pedreiro[1];Servente[2];Electricista[4]**	
8	**ILUMINAÇÃO DECORATIVA**	**14 dias**	**Qua 17/08/16**	**Ter 30/08/16**	**Betoneira[1];Camião basculante[1];Equip.de pedreiro[1];Giratória ZX80[1];Retroescavadora[1];Equipamento de electricista[1]**	**Electricista[4];Servente[2];Pedreiro[1];Motorista de pesados[1];Manobrador de máquinas[2]**	**7**
9	**ALVENARIAS**	**21 dias**	**Qua 31/08/16**	**Ter 20/09/16**	**Giratória ZX50[1];Equip.de pedreiro[1];Betoneira[1];Ferramentas de uso**	**Manobrador de máquinas[1];Pedreiro[3];Servente[2];Pintor[2]**	**6**
10	**SERRALHARIAS**	**14 dias**	**Qua 21/09/16**	**Ter 04/10/16**	**Equipamento de serralharia[1];Ferramentas de uso geral[1]**	**Serralheiro[4]**	**9**
11	**LANCIS**	**21 dias**	**Qua 05/10/16**	**Ter 25/10/16**	**placa compactadora[1];Manitou multifunções[1];Giratória ZX50[1];Ferramentas de uso geral[1];Equip.de pedreiro[1];Autobetoneira[1]**	**Servente[2];Pedreiro[3];Manobrador de máquinas[2]**	**10**
12	**PAVIMENTAÇÕES**	**100 dias**	**Qua 26/10/16**	**Qui 02/02/17**			**11**
13	**CALÇADA DE PAVÉ**	**37 dias**	**Qua 26/10/16**	**Qui 01/12/16**	**Camião basculante[1];Manitou multifunções[1];Giratória ZX80[1];Ferramentas de uso geral[1];cilindro compactador[1];Equip.calceteiro[1];placa compactadora[1]**	**Calceteiro[5];Manobrador de máquinas[2];Motorista de pesados[1];Servente[2]**	
14	**CALÇADA DE GRANITO 11X11**	**26 dias**	**Sex 02/12/16**	**Ter 27/12/16**	**Camião basculante[1];Equip.calceteiro[1];Ferramentas de uso geral[1];Giratória ZX80[1];cilindro compactador[1];Manitou multifunções[1];placa compactadora[1]**	**Servente[2];Motorista de pesados[1];Manobrador de máquinas[2];Calceteiro[5]**	**13**
15	**CALÇADA DE GRANITO 6X6**	**16 dias**	**Qua 28/12/16**	**Qui 12/01/17**	**Camião basculante[1];Equip.calceteiro[1];Ferramentas de uso geral[1];Giratória ZX80[1];cilindro compactador[1];Manitou multifunções[1];placa compactadora[1]**	**Servente[2];Motorista de pesados[1];Manobrador de máquinas[2];Calceteiro[5]**	**14**
16	**PAVIMENTO AMORTECEDOR**	**21 dias**	**Sex 13/01/17**	**Qui 02/02/17**	**Camião basculante[1];Manitou multifunções[1];Giratória ZX80[1];Ferramentas de uso geral[1];cilindro compactador[1];Equip. de aplic. de pav. amortecedor[1];Autobetoneira[1];Equip.de pedreiro[1]**	**Servente[2];Motorista de pesados[1];Manobrador de máquinas[2];Pedreiro[4];Aplicador de pavimento amortecedor[4]**	**15**
17	**SINALIZAÇÃO**	**1 dia**	**Sex 03/02/17**	**Sex 03/02/17**	**Equip.de pedreiro[1];Betoneira[1];Retroescavadora[1];Equipamento de marcação rodoviaria [1]**	**Servente[1];Manobrador de máquinas[1];Pedreiro[1];Aplicador de marcação rodoviaria[4]**	**12**
18	**EQUIPAMENTO URBANO**	**30 dias**	**Sex 03/02/17**	**Sáb 04/03/17**			**12**
19	**PARQUE INFANTIL**	**7 dias**	**Sex 03/02/17**	**Qui 09/02/17**	**Equipamento especifico[1]**	**Tecnico espec. em parque infantis, mobiliario urbano e equip. de fitness exterior[6]**	
20	**MOBILIARIO URBANO**	**7 dias**	**Sex 10/02/17**	**Qui 16/02/17**	**Equipamento especifico[1]**	**Tecnico espec. em parque infantis, mobiliario urbano e equip. de fitness exterior[6]**	**19**
21	**EQUIPAMENTO DE FITNESS**	**5 dias**	**Sex 17/02/17**	**Ter 21/02/17**	**Equipamento especifico[1]**	**Tecnico espec. em parque infantis, mobiliario urbano e equip. de fitness exterior[6]**	**20**
22	**VELAS DE ENSOMBRAMENTO**	**11 dias**	**Qua 22/02/17**	**Sáb 04/03/17**	**Equipamento especifico[1]**	**Tecnico espec. em parque infantis, mobiliario urbano e equip. de fitness exterior[6]**	**21**
23	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**	**2 dias**	**Dom 05/03/17**	**Seg 06/03/17**	**Equipamento de limpeza[1]**	**Servente[3]**	**18**
24	**RECEPÇÃO PROVISÓRIA**	**1 dia**	**Ter 07/03/17**	**Ter 07/03/17**			**23**
